

faire signe P.V
+ Solde = 4950 €
à l'adresse de Godec

3465 €

tel. 06 43 96 90 88

Monsieur HUBERT DERSOIR

22 AVENUE DE CHAMPAGNE 53400 CRAON

0243063631 0671166655

PROCES-VERBAL DE RECEPTION DE TRAVAUX

concernant les travaux exécutés par l'entreprise citée ci-dessus en date du 24/6/25
relatifs à la commande N°00564 du 18/06/2025 : STATION DE TRAITEMENT DE L'EAU.

Equipe : Boivilland

Le client déclare que :

- ☒ la réception est prononcée sans réserve avec effet à la date du 24/6/25
- ☐ la réception est prononcée avec réserves mentionnées dans l'état des réserves figurant au verso avec effet à la date du

Les garanties découlant des articles 1792, et 2270 du Code Civil commencent à courir à compter de la signature du présent procès-verbal.


La signature du procès-verbal et le règlement des travaux autorisent le client soussigné à prendre possession de l'ouvrage.

Fait à CRAON le 24 Juin 2025

en 2 exemplaires (1 pour chacune des parties)

Signature du représentant de l'entreprise :

Signature du client :

☐

DEVIS RECU

☐

CADRE DE CONTRIBUTION ENGIE RECU

☐

FACTURE PRO FORMA RECUE


Reçu chèque(s) N°

8288912 → 1732,50

D'un montant de

8288913 → 1732,50

	Désignation	Qté	P.U.H.T.	Total H.T.	TVA
	Sous-sol : POSE DE LA STATION DE TRAITEMENT DE L'EAU <i>Sous réserve de faisabilité du chantier. Temps de pose; plus ou moins une demi-journée.</i>	1	400,00	400,00	10



GODECEAU
21 Rue de la Minoterie
44 710 ST LEGER LES VIGNES
Tel : 06 43 96 90 88

Monsieur HUBERT DERSOIR
22 AVENUE DE CHAMPAGNE

53400 CRAON

Commande n° 00564

Date : 18/06/2025
Code Client : DIV45811754010
Tel. 0243063631/0671166655
Fax.

Date de visite préalable : 03/06/2025


Votre contact : Mr TOUZEAU Julien 06 98 88 18 03

Délai : 6 mois à compter du caractère de commande

Livraison : Monsieur HUBERT DERSOIR - 22 AVENUE DE CHAMPAGNE - - 53400 CRAON
Réf : STATION DE TRAITEMENT DE L'EAU

Commande n° 00564 du 18/06/2025

	Désignation	Qté	P.U.H.T.	Total H.T.	TVA
	Sous-sol : MISE EN PLACE DU CHANTIER <i>Mise en place du chantier, Préparation des protections, nettoyage en fin de chantier et Déplacement.</i>	1	500,00	500,00	10
	Sous-sol : CONDITIONNEUR D'EAU <i>Le conditionneur d'eau de marque ECEAULOGIQUE à été créée pour offrir la meilleure eau, le maximum de confort et de durée de vie. Ses fonctionnalités facilitent son utilisation tout en garantissant une performance élevée. Son média filtrant révolutionnaire vous procure une eau au goût inégalé. Vous pouvez économiser tout en préservant vos appareils électroménagers comme le lave-vaisselle, le lave-linge, vos installations de plomberie. Fonctionnement sur batterie autonome. Type de régénération Contre-Courant. Fabrication Française, Norme NSF et CE. Garantie 5 ans. Largeur: 24 cm .Ce type d'appareillage demande un entretien régulier et le remplacement de la batterie que nous pouvons réaliser au prix de 110 euros.</i>	1 U	3 600,00	3 600,00	10

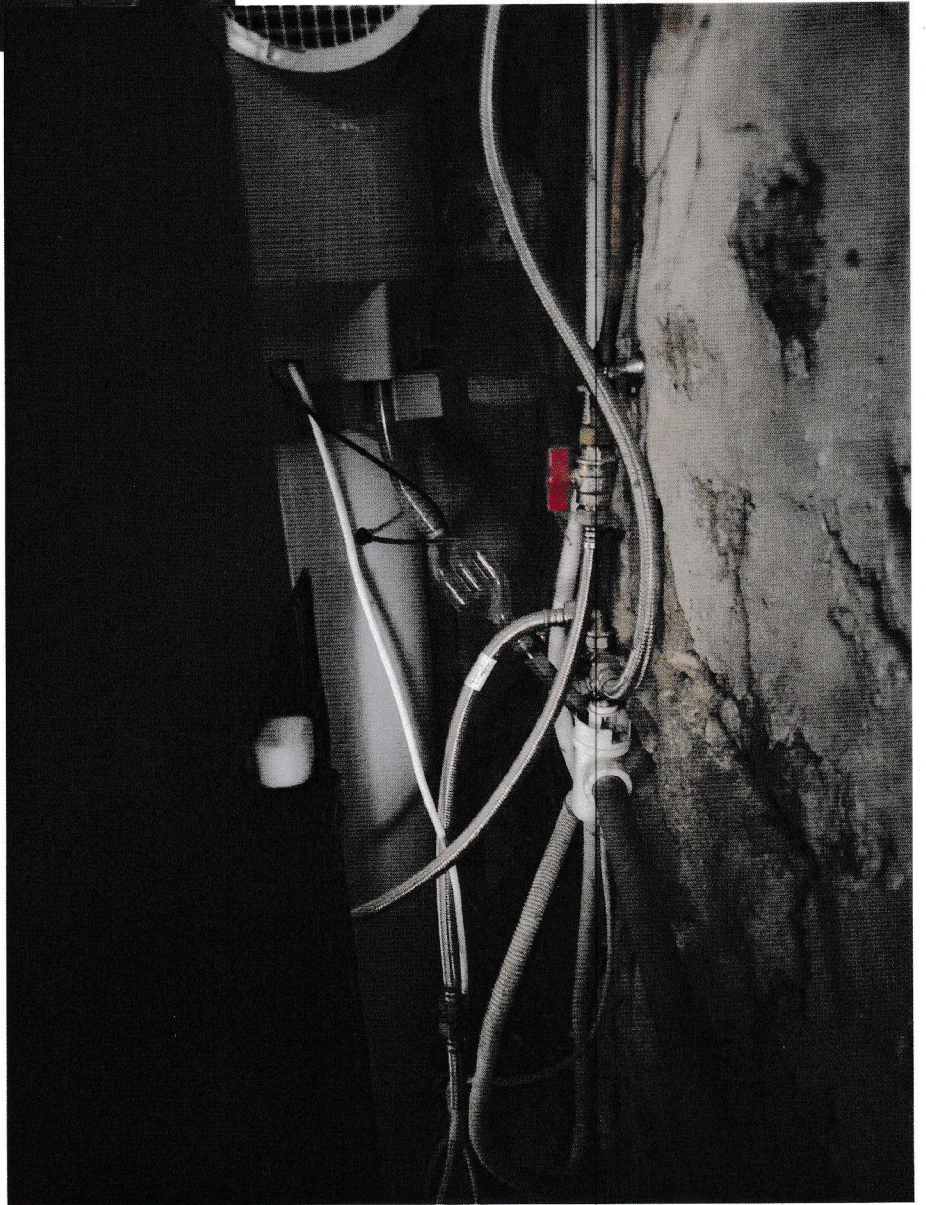

Intervention

MES / 24/6/25

00003


Nom : Denson Hubert
 Adresse : 22 Av de Champagne
 Code postal : 53400 Ville : Chalon
 Adresse mail :
 Téléphone : 06 71 16 66 55 Portable :
 Type d'appareil :
 Numéro de série :  1020001381-YCK-01-0019

Vérification avant mise en service		OK	NOK
1	Vérification intégrité de l'appareil (appareils intacts, absence de choc, positionnement du bac à sel sur surface plane et stable)	☒	☐
2	Présence vannes isolement (amont et aval de l'installation)	☒	☐
3	Présence régulateur de pression réglée à 3 bars	☐	☒
4	Présence prise conforme aux réglementations en vigueur NF C 15-100 (vol 2) à une distance supérieure à 0,6 mètre de la vanne et en position haute	☒	☐
5	Présence évacuation de la tête reliée à l'égoût avec un siphon anti-remontées et Air Gap empêchant tous retours possibles des égoûts vers la tête de l'adoucisseur DTU 60.1 et 60.11	☒	☐
6	Présence sel dans le bac NF-EN-973	☒	☐
7	Préfiltration amont installée	☒	☐
8	Mise sous pression de l'appareil	☒	☐
9	Vérification de l'ensemble des étanchéités - position service	☒	☐
10	Contrôle fuite et suintement	☒	☐
11	Présence clapet anti-retour en amont de l'appareil (optionnel)	☐	☒

Mise en service			
1	Vérification des paramètres de la vanne	☒	
2	Mesure dureté de l'eau en amont de l'adoucisseur	13 °Th	
3	Réglage du volume d'eau entre 2 régénérations dans la tête	☒	
4	Lancement régénération en manuel	☒	
5	S'assurer du bon passage de l'ensemble des phases de régénération	☒	
6	Réglage du mixing et mesure de la dureté de l'eau en aval de l'adoucisseur après réglage	1 °Th	

Observations

Signature Client :



Signature Technicien :

Intervention

YES / 24/6/25

00003

Nom : Dandois Hubert
 Adresse : 22 Av de Champagne
 Code postal : 53400 Ville : Chalon
 Adresse mail :
 Téléphone : 06 71 16 66 55 Portable :
 Type d'appareil :
 Numéro de série :

Vérification avant mise en service

		OK	NOK
1	Vérification intégrité de l'appareil (appareils intacts, absence de choc, positionnement du bac à sel sur surface plane et stable)	☒	☐
2	Présence vannes isolement (amont et aval de l'installation)	☒	☐
3	Présence régulateur de pression réglée à 3 bars	☐	☒
4	Présence prise conforme aux réglementations en vigueur NF C 15-100 (vol 2) à une distance supérieure à 0,6 mètre de la vanne et en position haute	☒	☐
5	Présence évacuation de la tête reliée à l'égoût avec un siphon anti-remontées et Air Gap empêchant tous retours possibles des égoûts vers la tête de l'adoucisseur DTU 60.1 et 60.11	☒	☐
6	Présence sel dans le bac NF-EN-973	☒	☐
7	Préfiltration amont installée	☒	☐
8	Mise sous pression de l'appareil	☒	☐
9	Vérification de l'ensemble des étanchéités - position service	☒	☐
10	Contrôle fuite et suintement	☒	☐
11	Présence clapet anti-retour en amont de l'appareil (optionnel)	☐	☒

Mise en service

1	Vérification des paramètres de la vanne	☒	☐
2	Mesure dureté de l'eau en amont de l'adoucisseur	☒ 13 °Th	☐
3	Réglage du volume d'eau entre 2 régénérations dans la tête	☒	☐
4	Lancement régénération en manuel	☒	☐
5	S'assurer du bon passage de l'ensemble des phases de régénération	☒	☐
6	Réglage du mixing et mesure de la dureté de l'eau en aval de l'adoucisseur après réglage	☒ 1 °Th	☐

Observations

Signature Client :

Signature Technicien :
